

TYÖOHJEET:

Esikuormistuspenkereen alueelta poistetaan pinta- ja humusmaat ennen louheen läjittämistä. Lisäksi olemassa olevat rakenteet ja johdot tulee poistaa louhepenkereen alueelta.

Pintamaiden poistossa tulee huomioida, että alueella olevaa saven kuivakuorikerroksen pintaa ei tulee rikkoa, jotta pohjamaa pysyy kantavana ja sen päällä voidaan liikkua työkoneilla.

Mikäli pohjamaa on pehmeää ja se häiriintyy, asennetaan niille kohdille suodatinkangas N5 ja 300 mm murskekerros ennen louheen läjitystä.

Louhe kipataan kasaan penkereen reunalle, josta kaivinkoneella levitetään ja työnnetään louhetta penkereen reunalta ulospäin.

Alueelle asennetaan painumatarkkailulevyjä, mittaukset tehdään 1 kuukauden välein tonttien rakentamisen aloitukseen asti tai vähintään 24 kuukauden ajan.

Painumalevy ja mittaustanko tulee suojata alla olevan mukaisesti tai esim. asentamalla betonisia kaivonrenkaita mittaustangon ympärille.

 Painumatarkkailulevy

Levyjen koordinaatit:

1.

N: 6686995.13

E: 24520920.94
2.

N: 6686895.66

E: 24520936.75
3.



N: 6686882.53

E: 24521009.41
4.

N: 6687022.96

E: 24521039.10

Painumalevyn rakenne:

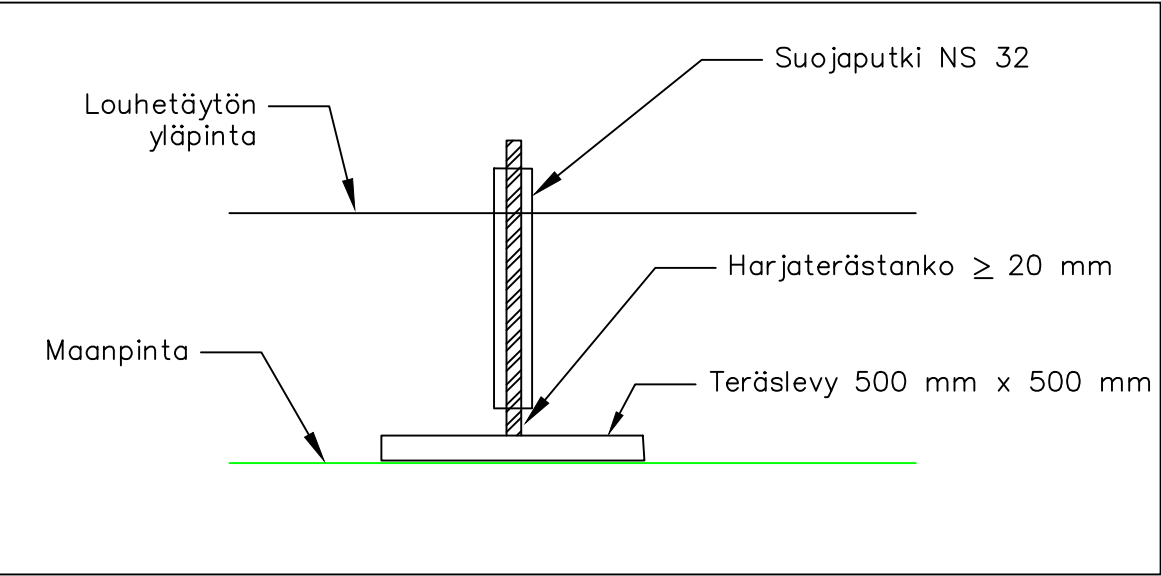

Mark	Change	Date	Plan.	Check
Project name				
Palojärven työpaikka-alueen esirakentaminen, laajennus				
Vihti				
Contents				
Läjitussyunnitelma, laajennus				
Louheen läjitussyunnitelma ja esikuormituspengeri				
				
Date	Drawn by	Date	Check by	Approval
30.9.2025	S. Kuusma	30.9.2025	J. Mäenpää	J. Hämäläinen
Coordinate			Scale	Drawing no.
ETRS GK24 FIN N2000			1:1000	511
